

DIRECTION DU BUREAU DES HYDROCARBURES

Identification du puits

Nom du puits	P.O.T. No 11
N° du puits	C045
Titulaire/Foreur	Petroleum Oil Trust
Année de forage	1893
Région administrative	Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine (11)
Profondeur de coupe des tubages sous la surface (pi)	3 m.

But du rapport d'étape de la phase 1

Recenser le maximum de renseignements permettant de localiser le puits, d'identifier les titulaires de permis, le propriétaire du terrain ou son utilisateur ainsi que les données techniques. Cette étape consiste à documenter le dossier en vue de préparer les prochaines phases.

I. Localisation et documents

1. Coordonnées géographiques

Source/coordonnées géographiques	Latitude	Longitude
GDH/Carte interactive	48° 50' 41,0"	-64° 38' 55,8"
Demande de forage	N/A	N/A
Rapport de fin de forage	N/A	N/A
Acte de déclaration	N/A	N/A
Anciens rapports d'inspection	48° 50' 41,0"	-64° 38' 55,8"
Autres (livre rouge)	48° 50' 39"	-64° 38' 53"

2. Documents pertinents à déposer dans le dossier

Document	Disponible	Non disponible
Fiche signalétique du puits	X	
Copie de carte topographique	X	
Copie du dossier du cadastre (lot, limites de la propriété, etc.)		
Rapport de fin de forage	X	
Rapport de la dernière inspection pour avoir le dernier statut et les recommandations	X	

II. Propriétaire foncier et/ou locataire

Informations (Infolot)	Propriétaire	Locataire	Domaine de l'état
Nom	Rousseau		
Prénom	Danielle		
N° de téléphone/télécopie	04.14.53.54		
Lot cadastral réformé	3 145 594		
Adresse	1456 Le Page, Québec QC, G2K2E6		


Autres		
--------	--	--

III. Le responsable du puits

	Permis de recherche	Permis de forage
Numéro	Aucun	1893FC045
Titulaire		Petroleum Oil Trust
Adresse du titulaire		N/A
Premier responsable de la compagnie		
Autres		

Fiche de fermeture du puits C045 P.O.T. No 11

Diagramme des travaux réalisés par le contractant

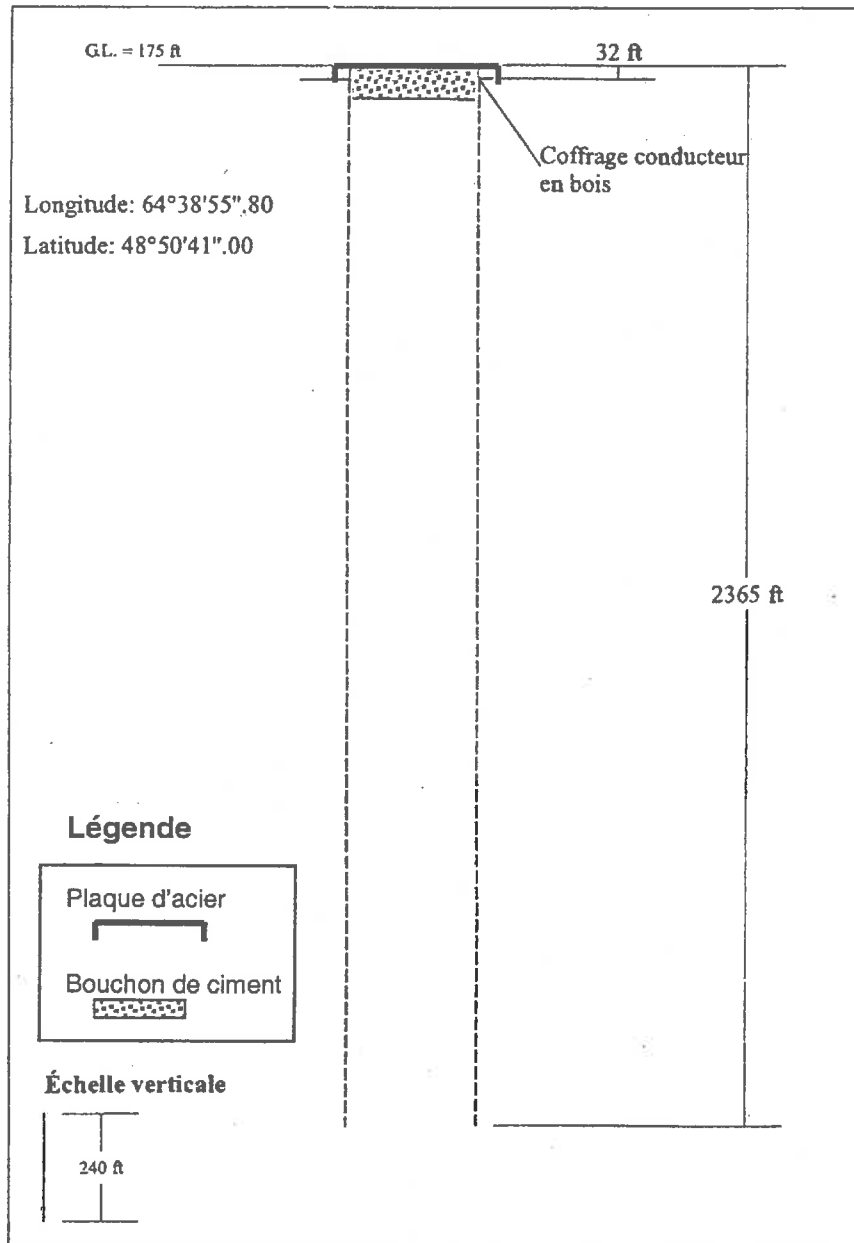

Signature: Ant. 14-53-54

Date: 15 novembre 1999

À compléter par le contractant

Procédure de fermeture du puits
P.O.T. No 11 C045
(1893FC045)

- Déterré jusqu'à 3 m avant d'atteindre le dessus du coffrage de 4 1/2" (acier pourri).
- Entré dans le trou jusqu'à 80 pieds.
- Rencontré une obstruction. Travaillé pendant une heure.
- Mise en place d'un bouchon de ciment de 0 – 80 pieds.
- Puits stable.
- Attente de 12 heures.
- Bouchon OK après 12 heures.
- Impossibilité de souder une plaque d'acier sur le coffrage.
- Pas d'écoulement.

PROGRAMME DE FERMETURE DES PUITTS DE LA GASPÉSIE, 1999

P.O.T. No 11

1893FC045

Opérateur : Foragaz

Inspecté : J.Y. Laliberté

4 novembre 1999

Photo 1

