

Bilan du Plan de travail 2021-2022 Restauration des sites miniers abandonnés

Juillet 2023

MINISTÈRE DES RESSOURCES NATURELLES ET DES FORÊTS



Note au lecteur

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) produit un bilan annuel du plan de travail afin de présenter les actions réalisées pour la restauration des sites miniers abandonnés inscrits sous sa responsabilité au Passif au titre des sites contaminés (PTSC). Les obligations liées au réaménagement et à la restauration de sites contaminés sous la responsabilité du gouvernement ou pouvant, de façon probable, relever de sa responsabilité, sont comptabilisées à titre de PTSC. Pour le présent exercice, l'ensemble des données présentées est en date du 31 mars 2022.

En décembre 2021, le gouvernement du Québec a mis en place le Cadre de référence pour la gestion des sites contaminés sous la responsabilité de l'État (Cadre de référence). Le Cadre de référence prévoit des méthodes de travail permettant de classer les sites et de prioriser les interventions. L'application de ces méthodes permet de déterminer, pour chaque site contaminé, à quelle étape menant à la restauration (cote) ce dernier est situé ainsi que les délais maximaux recommandés pour entreprendre les interventions de caractérisation environnementale et de restauration.

Plusieurs changements ont dû être apportés à l'inventaire des sites miniers du PTSC en date du 31 mars 2022 et, par conséquent, à ce qui était prévu dans le Plan de travail 2021-2022 dans le but d'assurer une concordance avec le Cadre de référence. La classification des étapes menant à la restauration ou à d'autres étapes connexes d'un site minier abandonné a été modifiée afin de refléter les étapes inscrites au Cadre de référence.

Le nombre de sites miniers abandonnés sous la responsabilité réelle de l'État, au 31 mars 2021, était de 400, tandis qu'il est de 351 au 31 mars 2022. Cette diminution s'explique principalement par le fait que 41 sites inscrits au PTSC sous la responsabilité réelle du MRNF au 31 mars 2021 ont été reclassifiés en responsabilité indéterminée au 31 mars 2022 étant donné qu'une vérification juridique est requise pour confirmer ultimement la responsabilité de ces sites. Les raisons détaillées ci-après expliquent le retrait des huit autres sites :

- La responsabilité de six sites (Pershing-Manitou, Wasamac 2, Canadian Malartic C, Aumaque, Capelton et Moss) a été modifiée, ceux-ci ne sont donc plus inscrits en responsabilité réelle au PTSC;
- Le site Québec Copper a été retiré du PTSC, car il appartient à un propriétaire privé;
- Le site Barnat a été retiré du PTSC, car ce site n'existe plus étant donné qu'il a été intégré à l'agrandissement de la fosse de la mine Canadian Malartic.

Par ailleurs, la responsabilité « incertaine, mais probable (>70 %) » inscrite au PTSC des sites Chrysotile (Belmina) et Harvey Hill (parc) a été modifiée pour « indéterminée », ce qui a mené à leur ajout dans la catégorie « en évaluation ». Le site Carrière 21E11-006 a également été ajouté dans la catégorie « en évaluation ».

Réalisation

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts
Direction de la restauration des sites miniers
5700, 4^e Avenue Ouest, bureau C-318
Québec (Québec) G1H 6R1

Téléphone : 418 627-6278

1 800 363-7233 (sans frais au Canada et aux États-Unis)

Courriel : services.mines@mern.gouv.qc.ca

Diffusion

Cette publication est accessible en ligne uniquement à l'adresse :

https://mmf.gouv.qc.ca/wp-content/uploads/BI_plan_travail_2021-2022_restoration_sites_miniers_abandonnes_MRNF.pdf

Photographies de la page couverture :

Site minier abandonné Darius (O'Brien), ministère des Ressources naturelles et des Forêts

© Gouvernement du Québec

Ministère des Ressources naturelles et des Forêts

Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2023

ISBN 978-2-550-94087-6 (PDF)

ÉTAPES D'UN PROJET DE RESTAURATION D'UN SITE MINIER ABANDONNÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

Étape	Activité	Description
Acquisition de données	Réalisation d'études de caractérisation environnementale de site (CES) - phases I, II et III	Ensemble des actions qui permettent de déterminer les risques de contamination et leurs emplacements, la présence et l'envergure de la contamination (le cas échéant) ainsi que les enjeux et les répercussions qui en découlent.
	Réalisation d'études connexes	Études dans des domaines tels que la géotechnique, la mécanique des roches, etc., pouvant être requises en fonction des particularités de chaque site minier abandonné.
Scénarios et plan de restauration	Élaboration de scénarios de restauration	Détermination des critères de conception adaptés à chaque site pour tenir compte de ses particularités et de ses enjeux.
	Validation et sélection du ou des scénarios de restauration	Validation du ou des scénarios de restauration à partir, notamment, d'une analyse de risques, d'une révision par les pairs et d'études de validation, le cas échéant.
	Élaboration du plan de restauration	Conception de l'ingénierie préliminaire pour un ou plusieurs scénarios de restauration.
	Obtention des autorisations pour les travaux de restauration	Demandes de permis et autorisations auprès des ministères et organismes provinciaux ainsi que fédéraux, des municipalités, etc., pour chacune des phases des travaux associées au plan de restauration.
	Préparation des plans et devis pour construction associés au plan de restauration	Documents techniques décrivant les travaux en vue de leur réalisation par un entrepreneur.
Travaux de restauration	Réalisation des travaux de restauration	Mise en œuvre du ou des scénarios de restauration élaborés, y compris l'attribution de contrats à un ou des entrepreneurs pour la réalisation des travaux, le suivi de la réalisation et l'acceptation finale des travaux.
Suivi et entretien postrestauration	Suivi de la qualité environnementale des eaux (de surface et souterraines)	Activités permettant de vérifier si les travaux réalisés atteignent les objectifs environnementaux.
	Suivi agronomique	Activités permettant de vérifier si les travaux réalisés atteignent les objectifs agronomiques.
	Entretien des ouvrages d'ingénierie et des aménagements connexes	Activités permettant d'assurer la pérennité des ouvrages d'ingénierie et des aménagements connexes faisant partie du plan de restauration.

AUTRES ACTIVITÉS REQUISES PENDANT LES ÉTAPES MENANT À UN PROJET DE RESTAURATION D'UN SITE MINIER ABANDONNÉ SOUS LA RESPONSABILITÉ DE L'ÉTAT

Étape	Activité	Description
Activité requise jusqu'à l'étape des scénarios de restauration et du plan de restauration	En planification	Planification requise pour les sites pour lesquels une étude de CES ou des scénarios de restauration doivent être débuter.
Activités pouvant être requises à chacune des étapes d'un projet de restauration	Application du Cadre de référence	<p>Le Cadre de référence prévoit des méthodes de travail permettant de classier les sites et de prioriser les interventions, en fonction des risques associés à la santé humaine et à l'environnement, par l'obtention de cote. Ainsi, des délais maximaux recommandés pour entreprendre les interventions de caractérisation environnementale et de restauration sont obtenus pour chaque cote. Ces méthodes doivent continuer à être appliquées à chaque étape afin de déterminer la cote appropriée.</p> <p>Les cotes de priorisation (caractérisation ou restauration) pouvant être obtenues et leur délai respectif sont les suivantes :</p> <p>CARACTÉRISATION</p> <ul style="list-style-type: none"> - PC-3 (3 ans) - PC-2 (5 ans) - PC-1 (7 ans) <p>RESTAURATION (SCÉNARIOS DE RESTAURATION)</p> <ul style="list-style-type: none"> - PI-3M (5 ans) - PI-2M (10 ans) - PI-1M (15 ans)
Activité requise avant l'application du Cadre de référence	En évaluation	Procéder à l'évaluation des sites miniers abandonnés qui pourraient être introduits ou réintroduits en responsabilité réelle au PTSC en fonction des critères de référence de contamination ou des conclusions de vérification juridique.

SOMMAIRE DES ACTIVITÉS RÉALISÉES EN 2021-2022

Étapes de restauration d'un site minier abandonné (après l'entrée en vigueur du Cadre de référence)		Nombre de sites au bilan du Plan de travail 2021-2022	Budget prévu (k\$)	Dépenses réelles (k\$)
Acquisition de données	Études de CES - phases I, II ou III	4	650,0	69,2
	Études connexes	1	1 300,0	381,2
Scénarios et plans de restauration		0	0,0	0,0
Travaux de restauration		5	15 903,0	15 200,4
Suivi et entretien postrestauration		16	233,5	453,2
Autres activités requises pendant la réalisation d'un projet de restauration d'un site minier abandonné sous la responsabilité de l'État ou autres sites pouvant être introduits ou réintroduits en responsabilité réelle au PTSC		Nombre de sites au bilan du plan de travail 2021-2022	Budget prévu (k\$)	Dépenses réelles (k\$)
En planification		100	363,0	171,8
Cadre de référence à débiter		225	4,0	1,0
En évaluation		100	102,0	25,8
TOTAL (excluant les sites de la catégorie «En évaluation»)¹		351	18 453,5	16 276,9
TOTAL (incluant les sites de la catégorie «En évaluation»)²		451	18 555,5	16 302,7


¹ Les sites dans la catégorie « En évaluation » ont été exclus du premier total étant donné qu'ils ne sont pas inscrits en responsabilité réelle au PTSC.

² Le budget total prévu diffère de celui inscrit au Plan de travail 2021-2022 étant donné que certains sites, qui étaient en responsabilité réelle au PTSC, ont été reclassifiés en responsabilité incertaine ou ont été retirés du PTSC.

FAITS SAILLANTS 2021-2022

Coûts totaux prévus pour les travaux de restauration : 15,9 M\$

Dépenses réelles totales pour les travaux de restauration : 15,2 M\$

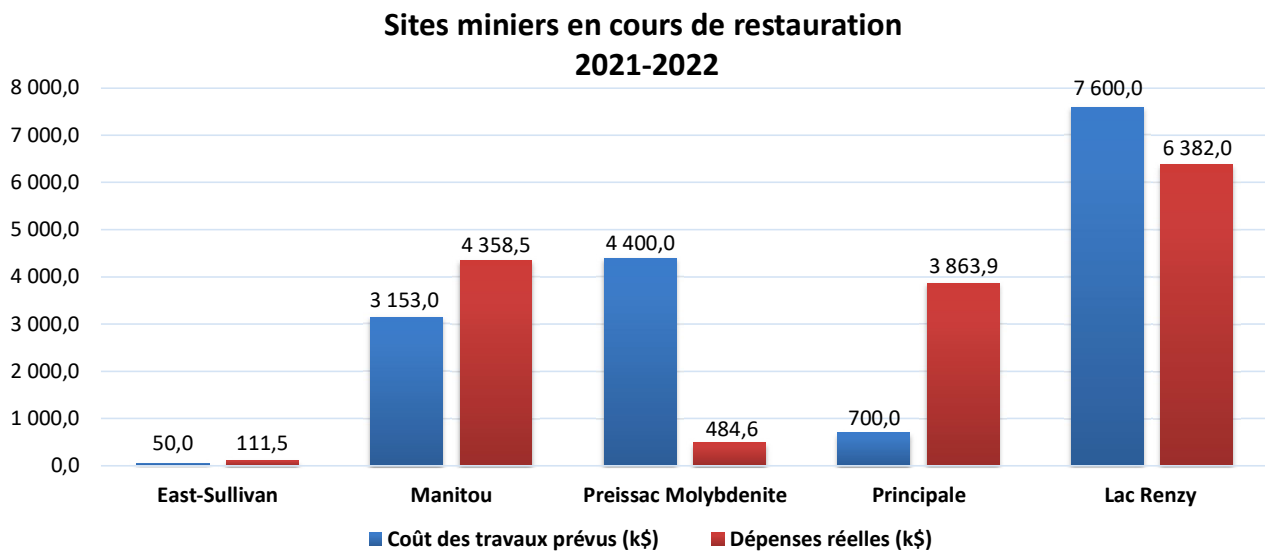

FAITS SAILLANTS 2021-2022 (suite)

Acquisition de données (études de CES – phase I, II ou III)

Les cinq études de CES – phase II ont débuté. Cependant, les travaux de terrain n'ont pu être réalisés, ce qui explique l'écart entre les coûts prévus (650,0 k\$) et les dépenses réelles (69,2 k\$). Les dépenses réelles auraient dû être plus élevées pour le site minier abandonné Darius (O'Brien) – nouveau parc. En effet, ces dépenses (20,2 k\$) ont plutôt été imputées au site minier abandonné Darius (O'Brien), qui est dans la catégorie « En planification ». Il est à noter que les opérations sur ces deux sites, situés côte à côte, ne seront associées qu'à un seul site au 31 mars 2023.

Acquisition de données (études connexes)

La majorité des activités liées aux études connexes ont été réalisées, à l'exception de l'étude géomécanique des roches qui n'a pu être menée pour le site St-Lawrence Colombium. La majorité des coûts étaient associés à cette étude, ce qui explique l'écart entre les coûts prévus (1 300,0 k\$) et les dépenses réelles (381,2 k\$).

Réalisation de travaux de restauration

Les dépenses réelles (15 200,4 k\$), pour les travaux de restauration, sont presque à hauteur des coûts prévus (15 903,0 k\$) (± 15 %). Cependant, des écarts pouvant être importants sont observés lors de l'analyse par site :

- Preissac Molybdenite : les travaux de consolidation des chantiers souterrains n'ont pas été effectués, ce qui explique l'écart important observé entre les coûts prévus (4 400,0 k\$) et les dépenses réelles (484,6 k\$).
- Lac Renzy : la cellule de confinement n'a pu être réalisée, car des validations sur la présence de xanthate ont dû être effectuées. C'est ce qui explique l'écart de 1 218,0 k\$ entre le budget prévu (7 600,0 k\$) et les dépenses réelles (6 382, k\$).
- Mine Principale : les dépenses réelles (3 863,9 k\$) ont été plus élevées que celles prévues (700,0 k\$) étant donné que des travaux ont pu commencer à la suite de l'obtention d'une autorisation (décret) du Conseil des ministres.
- East-Sullivan, des dépenses réelles (111,5 k\$) ont été supérieures à celles prévues (50,0 k\$) en raison de l'intervention effectuée sur le site à la suite d'un affaissement à la digue ouest.
- Manitou, les dépenses réelles (4 358,5 k\$) ont été plus élevées que prévu (3 153,0 k\$) puisque le remplacement du pipeline transportant des résidus a dû être effectué sur une distance d'environ 1,2 km.

Suivi et entretien postrestauration

De manière générale, les écarts observés entre les coûts prévus et les dépenses réelles pour certains sites (Aldermac, Barvue, Lorraine, Normétal, Wood Cadillac, Eustis, Suffield, et New Calumet) sont liés à des travaux de recherche dont les coûts n'avaient pas été pris en considération lors de la planification. Cela s'est également produit avec une étude relative à l'entretien des digues pour le site Mines Madeleine.

En planification

L'écart entre les coûts estimés et les dépenses réelles est principalement associé aux sites qui étaient antérieurement classifiés « À restaurer » et aux sites de Schefferville. En excluant ces sites, les coûts prévus pour les autres sites sont, de manière générale, comparables aux dépenses réelles.

La majorité des dépenses pour le site minier abandonné Darius (O'Brien) auraient dû être imputées au site minier abandonné Darius (O'Brien) – nouveau parc qui est dans la catégorie « Acquisition de données (études de CES – phase I, II ou III) ». Il est à noter que ces deux sites, situés côte à côte, ne seront associés qu'à un seul site au 31 mars 2023.

Application du Cadre de référence

Des travaux de nettoyage ont eu lieu sur les sites d'exploration du Nunavik. Cependant, aucun relevé de dépenses n'a été transmis au MRNF pour paiement, ce qui explique le faible montant des dépenses réelles. Pour les sites d'exploration sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James, aucun travail de nettoyage n'a été effectué.

En évaluation

Comme la responsabilité de plusieurs de ces sites doit être analysée, les budgets prévus pour ces sites n'ont pas été dépensés. De manière générale, les dépenses sont de faible envergure. Lorsque des besoins en sécurisation sont identifiés, des dépenses plus élevées sont attendues.

ACQUISITION DE DONNÉES (Études de CES - Phases I, II ou III)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2022 (k\$)	Travaux prévus en 2021-2022	Coût des travaux prévus en 2021-2022 (k\$)	Travaux réalisés en 2021-2022	Dépenses réelles en 2021-2022 (k\$)
Abitibi-Témiscamingue	Beaudry (carrière)	1	39,6	Étude de CES — phase II	130,0	Appel d'offres terminé et début du mandat d'étude de CES — phase II (réunion de démarrage et programme de travail).	18,2
Abitibi-Témiscamingue	Darius (O'Brien) - nouveau parc ¹	0	46,1	Étude de CES — phase II	130,0	Appel d'offres terminé et début du mandat d'étude de CES — phase II (réunion de démarrage et programme de travail).	1,2
Abitibi-Témiscamingue	Duvan Copper	1	34,4	Étude de CES — phase II	130,0	Appel d'offres terminé et début du mandat d'étude de CES — phase II (réunion de démarrage et programme de travail).	16,4
Abitibi-Témiscamingue	Fontana	1	35,5	Étude de CES — phase II	130,0	Appel d'offres terminé et début du mandat d'étude de CES (réunion de démarrage et programme de travail).	16,3
Abitibi-Témiscamingue	Inmont Copper	1	37,9	Étude de CES — phase II	130,0	Appel d'offres terminé et début du mandat d'étude de CES — phase II (réunion de démarrage et programme de travail).	17,1
TOTAL		4	193,4		650,0		69,2

¹ Ce site est déjà comptabilisé dans la section « En planification ». Conséquemment, le chiffre « 0 » est indiqué dans la colonne « Nombre de sites ».

ACQUISITION DE DONNÉES (Études connexes)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2022 (k\$)	Travaux prévus en 2021-2022	Coût des travaux prévus en 2021-2022 (k\$)	Travaux réalisés en 2021-2022	Dépenses réelles en 2021-2022 (k\$)
Laurentides	St. Lawrence Columbiun	1	1 927,9	Conception et acquisition de données complémentaires requises.	1 300,0	Préparation du devis technique pour l'étude géomécanique des roches (stabilité du pilier de surface). Réalisation de l'étude de sécurité de la dalle du puits principal. Rédaction des rapports techniques (géotechnique et hydrologique).	381,2
TOTAL		1	1 927,9		1 300,0		381,2

RÉALISATION DE TRAVAUX DE RESTAURATION (y compris les scénarios et les plans de restauration)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2022 (k\$)	Travaux prévus en 2021-2022	Coût des travaux prévus en 2021-2022 (k\$)	Travaux réalisés en 2021-2022	Dépenses réelles en 2021-2022 (k\$)
Abitibi-Témiscamingue	East-Sullivan	1	1 042,3	Poursuite des travaux de restauration.	50,0	Étude géotechnique des digues de confinement du parc à résidus et rédaction de documents connexes quant à leur réfection. Déposition de matières résiduelles ligneuses. Inspection statutaire des digues de confinement. Inspection d'un affaissement à la digue Ouest et correction de ce dernier. Travaux de recherche liés à la restauration du site (validation de l'instrumentation des ouvrages).	111,5
Abitibi-Témiscamingue	Manitou	1	29 748,8	Travaux de restauration et suivi environnemental de la rivière Bourlamaque et du ruisseau Manitou.	3 153,0	Travaux de restauration (déposition des résidus de la mine Goldex au site Manitou). Travaux de remplacement du pipeline sur 1,2 km. Travaux de recherche liés à la restauration du site (caractérisation et sélection préliminaire de matériaux).	4 358,5
Abitibi-Témiscamingue	Preissac Molybdenite	1	15 488,5	Travaux de restauration (réhabilitation de la halde et des boisés) et poursuite de la conception.	4 400,0	Conception pour les étapes de restauration à venir.	484,6
Nord-du-Québec	Principale	1	13 803,0	Obtention des autorisations environnementales et travaux de restauration (essais de végétalisation, réhabilitation du secteur des infrastructures, restauration du parc A, etc.).	700,0	Démolition d'une partie des structures, désamiantage non terminé, essais de végétalisation, transport des matériaux en vrac.	3 863,9
Outaouais	Lac Renzy	1	24 479,3	Poursuite des travaux de restauration.	7 600,0	Empilement d'une partie des matériaux contaminés en xanthate et finalisation des plantations, excepté les plantes aquatiques.	6 382,0
TOTAL		5	84 561,8		15 903,0		15 200,4

SUIVI ET ENTRETIEN POSTRESTAURATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2022 (k\$)	Travaux prévus en 2021-2022	Coût des travaux prévus en 2021-2022 (k\$)	Travaux réalisés en 2021-2022	Dépenses réelles en 2021-2022 (k\$)
Abitibi-Témiscamingue	Aldermac	1	9 051,6	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, lorsque requis, travaux d'entretien postrestauration.	16,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site. Travaux de recherche liés à la restauration du site (analyse de la performance des méthodes de restauration et validation de l'instrumentation des ouvrages).	90,0
Abitibi-Témiscamingue	Barvue	1	35 318,9	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, lorsque requis, travaux d'entretien postrestauration.	16,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site. Travaux de recherche liés à la restauration du site (validation de l'instrumentation des ouvrages et caractérisation de la végétation).	43,6
Abitibi-Témiscamingue	Lorraine	1	325,3	Échantillonnage d'eau et inspection du site et lorsque requis, travaux d'entretien postrestauration.	16,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site. Travaux de recherche liés à la restauration du site (validation de l'instrumentation des ouvrages et caractérisation de la végétation).	39,0
Abitibi-Témiscamingue	Normétal	1	99,1	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, lorsque requis, travaux d'entretien postrestauration.	11,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site. Travaux de recherche liés à la restauration du site (validation de l'instrumentation des ouvrages).	23,2
Abitibi-Témiscamingue	Preissac	1	30,4	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, lorsque requis, travaux d'entretien postrestauration.	16,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site.	7,7
Abitibi-Témiscamingue	Stadacona	1	25,3	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, lorsque requis, travaux d'entretien postrestauration.	6,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site.	2,0
Abitibi-Témiscamingue	Terrains Aurifères	1	37,8	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, lorsque requis, travaux d'entretien postrestauration.	6,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site.	4,0
Abitibi-Témiscamingue	Wood Cadillac	1	173,2	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, lorsque requis, travaux d'entretien postrestauration.	15,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site. Travaux de recherche liés à la restauration du site (validation de l'instrumentation des ouvrages).	33,6
Côte-Nord	Sablère 12K05-001	1	3,6	Échantillonnage pour finaliser le dossier.	2,5	Aucuns travaux réalisés.	0,0
Estrie	Eustis	1	3 653,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, lorsque requis, travaux d'entretien postrestauration.	16,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site. Travaux de recherche liés à la restauration du site (validation de l'instrumentation des ouvrages).	33,4
Estrie	Suffield	1	2 838,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, lorsque requis, travaux d'entretien postrestauration.	16,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site. Travaux de recherche liés à la restauration du site (validation de l'instrumentation des ouvrages).	20,0
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Candego	1	41,7	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, lorsque requis, travaux d'entretien postrestauration.	16,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site.	9,4
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Mines Madeleine	1	339,8	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, lorsque requis, travaux d'entretien postrestauration.	25,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site. Étude relative à l'entretien des digues.	79,5
Mauricie	Somex	1	38,2	Échantillonnage d'eau et inspection du site et, lorsque requis, travaux d'entretien postrestauration.	16,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site.	7,7
Nord-du-Québec	Opémiska	1	5 322,1	Échantillonnage d'eau et inspection du site et lorsque requis, travaux d'entretien postrestauration.	15,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site.	8,3
Outaouais	New Calumet	1	15 540,5	Échantillonnage d'eau et inspection du site et lorsque requis, travaux d'entretien postrestauration.	25,0	Échantillonnage d'eau et inspection du site. Travaux de recherche liés à la restauration du site (validation de l'instrumentation des ouvrages et caractérisation de la végétation).	51,7
TOTAL		16	72 838,4		233,5		453,2

EN PLANIFICATION (Sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est prévu)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2022 (k\$)	Travaux prévus en 2021-2022	Coût des travaux prévus en 2021-2022 (k\$)	Travaux réalisés en 2021-2022	Dépenses réelles en 2021-2022 (k\$)
Abitibi-Témiscamingue	Abcourt (halde)	1	18,2	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site et le processus de vérification juridique est en cours.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site et le processus de vérification juridique est en cours.	1,6
Abitibi-Témiscamingue	Akasaba	1	10,2	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Anglo-Rouyn	1	3,8	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Ansil	1	6,4	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,7
Abitibi-Témiscamingue	Arntfield	1	192,2	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	5,9
Abitibi-Témiscamingue	Beattie (parc)	1	276,8	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	4,2
Abitibi-Témiscamingue	Bevcon	1	81,9	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Abitibi-Témiscamingue	Blairdon	1	4,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Bouscadillac	1	5,8	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Chimo	1	7,4	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	2,2
Abitibi-Témiscamingue	Claverny	1	51,4	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Cournor	1	158,6	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,6
Abitibi-Témiscamingue	Darius (O'Brien)	1	235,3	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	20,2
Abitibi-Témiscamingue	Delbridge	1	61,9	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Donalda	1	5,2	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Dorval-Beacon (parc)	1	36,3	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site et le processus de vérification juridique est en cours.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site et le processus de vérification juridique est en cours.	0,5
Abitibi-Témiscamingue	East-Waite	1	4,3	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,8
Abitibi-Témiscamingue	Guinard	1	3,4	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Abitibi-Témiscamingue	Granada (ancien parc)	1	153,4	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,6
Abitibi-Témiscamingue	Kewagama	1	42,6	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Lacoma	1	11,7	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,8
Abitibi-Témiscamingue	Lapa (Zulapa)	1	176,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Lucien Béliveau	1	12,3	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Abitibi-Témiscamingue	McWatters	1	9,4	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Abitibi-Témiscamingue	Molybdenite Corporation	1	134,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Abitibi-Témiscamingue	New Bidlamaque	1	3,6	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Normetmar	1	151,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	4,1
Abitibi-Témiscamingue	Nortrac	1	5,9	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Abitibi-Témiscamingue	Pandora	1	189,7	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Abitibi-Témiscamingue	Perron	1	5,8	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,6

EN PLANIFICATION (Sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est prévu)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2022 (k\$)	Travaux prévus en 2021-2022	Coût des travaux prévus en 2021-2022 (k\$)	Travaux réalisés en 2021-2022	Dépenses réelles en 2021-2022 (k\$)
Abitibi-Témiscamingue	Pierre Beauchemin	1	5,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Powell (Rouyn)	1	6,4	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Québec Explorers	1	7,7	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Québec Lithium (ancien parc)	1	6,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Quésabé	1	4,8	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Regcourt	1	6,7	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Resenore	1	7,9	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Sildor	1	4,4	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Abitibi-Témiscamingue	Simon Ouest	1	6,4	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Siscoe	1	3 180,8	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site et suivi de la qualité de l'eau.	5,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site, et échantillonnage d'eau.	8,2
Abitibi-Témiscamingue	Sullivan	1	25,4	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Swanson	1	5,8	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,9
Abitibi-Témiscamingue	Thompson Cadillac	1	141,6	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,8
Abitibi-Témiscamingue	Vauze	1	258,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Abitibi-Témiscamingue	Waite Ackerman	1	6,3	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Abitibi-Témiscamingue	Waite-Amulet	1	309,6	Vigie (inspection) du site.	10,0	Vigie (inspection) du site.	14,7
Abitibi-Témiscamingue	Wendell	1	39,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Abitibi-Témiscamingue	West Malartic	1	168,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Abitibi-Témiscamingue	Wrightbar	1	3,8	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Bas-Saint-Laurent	Uniquartz	1	15,9	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site et processus de vérification juridique est cours.	1,0	Aucuns travaux réalisés, et processus de vérification juridique en cours.	0,0
Chaudière-Appalaches	Montréal (Coleraine)	1	133,3	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,8
Chaudière-Appalaches	Reed-Bélangier	1	34,2	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	4,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,9
Côte-Nord	Lac Jeannine	1	98,6	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	4,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	16,4
Côte-Nord	Schefferville	11	85,2	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	50,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	19,7
Estrie	Albert	1	30,2	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Estrie	Clinton	1	7,6	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Estrie	Cupra	1	7,6	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Estrie	High Water	1	5,6	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Estrie	Marcoux	1	6,9	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Estrie	Moulton Hill	1	8,1	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4

EN PLANIFICATION (Sites dont une étude de CES ou un scénario de restauration est prévu)

Région	Nom du site	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2022 (k\$)	Travaux prévus en 2021-2022	Coût des travaux prévus en 2021-2022 (k\$)	Travaux réalisés en 2021-2022	Dépenses réelles en 2021-2022 (k\$)
Estrie	St-Robert-Metals	1	4,9	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Estrie	Van Reet	1	7,8	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Estrie	Weedon	1	10,8	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Fédéral 22B16	1	5,3	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,6
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Sullipek	1	5,1	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Laurentides	Asbury Graphite	1	13,4	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,8
Mauricie	Tétreault 1 et 2, Montauban United	3	565,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	30,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	2,8
Nord-du-Québec	Asbestos Hill	1	65,9	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Aucuns travaux réalisés.	0,0
Nord-du-Québec	Cedar Bay	1	15,3	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	4,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Nord-du-Québec	Certac	1	127,2	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	4,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	4,0
Nord-du-Québec	Copper Cliff	1	6,2	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Nord-du-Québec	Copper Rand (parc)	1	0,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,0	Aucuns travaux réalisés.	0,0
Nord-du-Québec	Flordin	1	4,9	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Aucuns travaux réalisés.	0,0
Nord-du-Québec	Grandroy	1	24,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	4,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	6,5
Nord-du-Québec	Icon Sullivan	1	171,4	Vigie (inspection et entretien) du site	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site	0,9
Nord-du-Québec	Jaculet	1	18,1	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	4,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	4,1
Nord-du-Québec	Joe Mann (parc)	1	22,9	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	4,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	2,4
Nord-du-Québec	Joutel-Copper	1	186,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	2,6
Nord-du-Québec	Kokko Creek	1	8,2	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,9
Nord-du-Québec	Lac Garon	1	4,8	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,9
Nord-du-Québec	Lac Rose	1	35,1	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	4,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	4,4
Nord-du-Québec	Lemoine	1	10,9	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,6
Nord-du-Québec	Québec-Chibougamau	1	24,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	4,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	5,6
Nord-du-Québec	Rollmac	1	6,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,4
Outaouais	Asselin	1	7,2	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Outaouais	Back (Lac Smith)	1	448,8	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	10,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	4,7
Outaouais	Bertrand	1	13,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
Outaouais	Lac Jake	1	33,5	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	1,0	Vigie (inspection et, si requis, entretien) du site.	0,5
TOTAL		100	8 535,6		363,0		171,8

APPLICATION DU CADRE DE RÉFÉRENCE À DÉBUTER

Région	Nom du site	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2022 (k\$)	Travaux prévus en 2021-2022	Coût des travaux prévus en 2021-2022 (k\$)	Travaux réalisés en 2021-2022	Dépenses réelles en 2021-2022 (k\$)
Abitibi-Témiscamingue	Sablière 32C04-014	1	60,3	Si nécessaire, restauration du site.	2,0	Aucuns travaux réalisés.	0,0
Nord-du-Québec	Sablière 33F13-003	1	0,0	Étude de caractérisation phase I.	2,0	Aucuns travaux réalisés.	0,0
Nord-du-Québec	Sites d'exploration du Nunavik	10	3 233,9	Poursuite des travaux pour le nettoyage des sites.	. ¹	Travaux de nettoyage des sites.	0,5
Nord-du-Québec	Sites d'exploration sur le territoire Eeyou Istchee Baie-James	213	368,9	L'inventaire des sites d'exploration minière doit être mis à jour, comme prévu par l'entente. Un plan d'action général doit être déposé à cet effet.	. ¹	Inventaire des sites et modification de l'obligation de déposer un plan d'action général par le dépôt de plans d'action annuels par secteur.	0,5
TOTAL		225	3 663,1		4,0		1,0

¹ Les sommes investies en 2021-2022 seront proportionnelles aux travaux réalisés selon les dispositions prévues aux ententes.

EN ÉVALUATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2022 (k\$)	Travaux prévus en 2021-2022	Coût des travaux prévus en 2021-2022 (k\$)	Travaux réalisés en 2021-2022	Dépenses réelles en 2021-2022 (k\$)
Abitibi-Témiscamingue	Abbeville	1	2,8	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Adanac	1	2,9	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Arrowhead	1	3,5	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Aubelle	1	2,9	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Bassignac	1	3,7	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Belleterre (instructures)	1	10,6	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	7,3
Abitibi-Témiscamingue	Black Cliff	1	3,4	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Blondeau Nickel	1	3,2	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Buffadison	1	8,8	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Claremont	1	31,3	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,7
Abitibi-Témiscamingue	Denain	1	4,2	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Fisher	1	4,1	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Garney	1	2,6	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Halliwell	1	2,8	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Joubi	1	3,1	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Kierens	1	2,8	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Lac Fortune Ouest	1	53,8	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Lapaska	1	4,1	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,3
Abitibi-Témiscamingue	New Marlon	1	4,7	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Northern Québec	1	2,3	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Pointe du chasseur - 2	1	3,7	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Randall	1	3,1	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Rochette	1	4,5	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,4
Abitibi-Témiscamingue	Sablières NE 32D01-003	1	1,0	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	2,0	Aucune inspection	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Sablières 32D03-005	1	105,8	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	2,0	Aucune inspection	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Sablières 32D11-010	1	0,8	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	2,0	Aucune inspection	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Shawkey	1	7,3	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Abitibi-Témiscamingue	Siscoe Nord	1	2,0	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,4
Abitibi-Témiscamingue	South Tiblemont	1	4,4	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Stabell	1	4,4	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Standard Gold Mines	1	3,3	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,3

EN ÉVALUATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2022 (k\$)	Travaux prévus en 2021-2022	Coût des travaux prévus en 2021-2022 (k\$)	Travaux réalisés en 2021-2022	Dépenses réelles en 2021-2022 (k\$)
Abitibi-Témiscamingue	Venus	1	5,3	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,3
Abitibi-Témiscamingue	Vianor	1	3,1	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Côte-Nord	Sablière 22F08-007	1	4,7	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Capitale-nationale	Petit Pré	1	1,6	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Centre-du-Québec	Québec Antimoine	1	4,5	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Centre-du-Québec	Yale	1	2,5	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Chaudière-Appalaches	American Chrome	1	8,6	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	2,7
Chaudière-Appalaches	Breeches-Est	1	2,4	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Chaudière-Appalaches	Continental	1	9,3	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,1
Chaudière-Appalaches	Chrysotile (Belmina)	1	0,0	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	0,0	Aucune inspection	0,0
Chaudière-Appalaches	Eastern Metals	1	33,4	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis, et processus de vérification juridique est en cours.	1,0	Inspection réalisée et processus de vérification juridique en cours.	0,4
Chaudière-Appalaches	Grand-Père	1	3,3	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Chaudière-Appalaches	Harvey Hill (parc)	1	0,0	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	0,0	Aucune inspection	0,0
Chaudière-Appalaches	St-Odilon Lafayette	1	18,8	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Estrie	Ascot Haskell	1	2,7	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Estrie	Boudreau	1	3,1	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Estrie	Carrière 21E11-006	1	1,1	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	0,0	Aucune inspection	0,0
Estrie	Clark	1	180,6	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,7
Estrie	Copperstream	1	2,7	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Estrie	Howard	1	27,3	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis, et processus de vérification juridique en cours.	1,0	Inspection réalisée et processus de vérification juridique en cours.	0,4
Estrie	Lac Memphrémagog	1	14,4	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis, et processus de vérification juridique en cours.	1,0	Inspection réalisée et processus de vérification juridique en cours.	0,4
Estrie	Mine St-François	1	4,6	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Estrie	Old Fletcher IV	1	5,2	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,2
Estrie	Wilson	1	2,0	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Lanaudière	Consumers Industrial	1	1,5	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Laurentides	Lac McGillivray	1	3,6	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Laurentides	Miller Graphite	1	2,7	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Mauricie	Montauban et Muscocho	2	157,5	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	2,0	Inspection réalisée	0,9
Montérégie	Acton Copper	1	23,1	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0

EN ÉVALUATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2022 (k\$)	Travaux prévus en 2021-2022	Coût des travaux prévus en 2021-2022 (k\$)	Travaux réalisés en 2021-2022	Dépenses réelles en 2021-2022 (k\$)
Nord-du-Québec	Abitibi-Asbestos	1	5,5	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	1,6
Nord-du-Québec	Cartwright	1	3,9	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,3
Nord-du-Québec	Chesbar	1	96,7	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	1,6
Nord-du-Québec	New Hosco	1	3,2	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,3
Nord-du-Québec	Phelps Dodge	1	4,6	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Nord-du-Québec	Radiore	1	3,1	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Inspection réalisée	0,3
Nord-du-Québec	Sablère 32104-008	1	30,4	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	2,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Beaudry, G	1	5,7	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Blackburn North Hill	1	79,2	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Blackburn Vavasour	1	17,9	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Evans (Cameron)	1	34,1	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Charbonneau	1	3,9	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	David Hodgkin	1	2,8	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Derry (Ceremco)	1	12,3	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Gauthier	1	57,7	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Analyse du site	0,4
Outaouais	Gemmil	1	9,9	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Grant et Emerald	2	46,2	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	2,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	High Rock	1	7,7	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Hilton	1	20,4	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis, et processus de vérification juridique en cours.	1,0	Inspection réalisée et processus de vérification juridique en cours.	0,4
Outaouais	Horse Shoe	1	13,8	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Kirkham	1	2,6	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Lac Rhéaume	1	21,8	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Mathewman (Green Lake)	1	11,2	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	McDonald	1	11,7	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Mine McLemments	1	38,8	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	New York	1	45,2	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	North American	1	37,6	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Ottawa Valley	1	3,7	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Pednaud	1	98,6	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Phosphate King	1	17,2	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Pugh et Weart	1	20,9	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0

EN ÉVALUATION

Région	Nom du site	Nombre de sites	Dépenses réelles de 2007 au 31 mars 2022 (k\$)	Travaux prévus en 2021-2022	Coût des travaux prévus en 2021-2022 (k\$)	Travaux réalisés en 2021-2022	Dépenses réelles en 2021-2022 (k\$)
Outaouais	Robitaille	1	3,6	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Sablère NE 31F14-001	1	1,6	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	2,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Sarrazin	1	3,8	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Stewart	1	5,4	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Villeneuve	1	5,9	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Walker	1	28,5	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
Outaouais	Welsh	1	5,3	Inspection et sécurisation du site, lorsque requis.	1,0	Aucune inspection	0,0
TOTAL		100	1 649,9		102,0		25,8

*Ressources naturelles
et Forêts*

Québec 
